



VOZN 2025

Variabel Onderhoud Zuid Nederland perceel Oost

Realisatie memo

Kunstwerk: Roode Vaart Zuid

Colofon

Projectnummer 723426
 Project VOZN
 Kenmerk Roode Vaart Zuid
 Kunstwerkcode 44C-102-01
 Rekenblad 5

Revisiebeheer

Revisie	Omschrijving	Opsteller	Datum:
0.1	Concept		14-3-2025
1.0	Definitief		14-3-2025

Inhoud

1	Inleiding.....	3
2	Kunstwerkgegevens	4
2.1	Locatie:	4
2.2	Omschrijving werkzaamheden ST&P	4
2.3	Benodigde werkruimte i.r.t. uit te voeren maatregel.....	5
2.4	Van toepassing zijnde generieke werkinstructie	6
2.5	CUR-118.....	6
2.6	Melding Bal	7
	Bijlage 1: VGM A3 uitvoeringsfase	8

1 Inleiding

In deze memo worden de door Gebr. Van Kessel ST&P uit te voeren maatregelen aan bovengenoemd kunstwerk uitgelicht, met als doel het leveren van input tbv het werkplan realisatie, voor de kunstwerken welke vallen onder de scope voor het VOZN 2025.

Tevens kan de inhoud van deze memo worden gebruikt als grondslag voor het bepalen van de uitvoeringsplanning en de benodigde VKM.

2 Kunstwerkgegevens

2.1 Locatie:

Rijksweg A17; kunstwerkcode 44C-102-01 Hm 3, HRL
Zuidelijke brug over de Roode Vaart



Overzicht onderzijde (noord) bron: Streetsmart



Overzicht onderzijde (zuid) bron: Streetsmart

2.2 Omschrijving werkzaamheden ST&P

Rupsnummer	Adviesmaatregel IHP
Rupsnummer	Acties
6966647	Herstellen betonschade vanaf water
6967633	Gaten herstellen en grond aanvullen vanaf het water

2.3 Benodigde werkruimte i.r.t. uit te voeren maatregel

K-4.5 Betonreparatie aan de damwandkop (schade 105):

Werkzaamheden vanaf ponton of boot. (let op! beide aan beide damwanden links en rechts)




Damwand herstellen en indien nodig grond aanvullen (schade 106):

Werkzaamheden vanaf ponton of boot. Grond aanvullen vanaf kade. (let op! beide aan beide damwanden links en rechts)



Door gaten in de kerende constructie (damwand) uitspoeling ontstaan, deze uitgespoelde grond aanvullen.



Benodigde werkruimte: Het verharde gedeelte bestaande uit klinkers en in het vaarwater

Benodigde tijd: 3 dagen.



2.4 Van toepassing zijnde generieke werkinstructie

Specifieke werkinstructies:

Gaten in kerende constructie herstellen

- We tekenen de damwand/slot af t.p.v. de nieuw op te lassen platen
- Schoonslijpen van het damwand/slot
- Plaat vast hechten en/of in de vorm van het slot kloppen
- Plaat af lassen
- Werkplaats opruimen

Er zal gekozen worden van een 5mm dikke staalplaat met een afmeting van ca. 200x200mm.

De werkzaamheden vanaf de pontons zullen per zijde (kade) worden uitgevoerd. Dus de doorgang voor het vaarverkeer zal tijdens onze werkzaamheden maar aan één zijde worden beperkt. Aan het einde van de werkzaamheden op het water, zullen de pontons uit het water verwijderd worden.

Generieke werkinstructie:

- K-4.5 & K4.8 Betonreparatie

Deze werkinstructies zijn generiek en gekoppeld aan de K-nummers welke zijn opgenomen in de raamovereenkomst.

Alle relevante werkinstructies worden digitaal beschikbaar gesteld voor verwerking in de realisatieplannen, middels toegang tot de gezamenlijke Sharepoint database.


2.5 CUR-118

Classificatie betonschade

- Uitvoeringsklasse: RT
- Gevolgklasse: GK1

2.6 Melding Bal

Voor de werkzaamheden op het water maken we gebruik van Easy pontons (www.easypontons.nl) die aan elkaar te koppelen zijn. Deze pontons zijn tevens in alle mogelijke modellen samen te stellen, om het werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

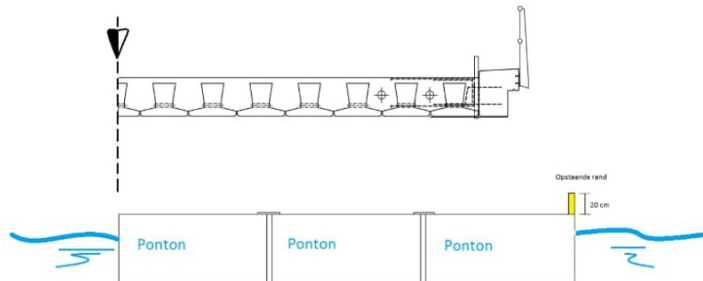

De pontons hebben een diepgang van 10-15 cm. Afhankelijk van de belasting op de pontons. Indien mogelijk en/of noodzakelijk kunnen deze pontons na het werk uit het water gehaald worden. De afmetingen van de pontons zullen ca. 2 m breed x 4 m lang zijn. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden boven een oppervlaktewater is een Melding Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gedaan op 12/05/2025.

Bijlage 1: VGM A3 uitvoeringsfase

Projectnaam : Kunstwerk Roode Vaart Zuid	Beschrijving van (de werkzaamheden van) het project: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Kunstwerk Roode Vaart Zuid</div>	Bijlagen:	V&G-coördinator ontwerpfase
Projectnummer : 723426		- Alarmkaart;	Naam [REDACTED]
Planning start : n.t.b.		- Project-RIE;	Tel.nr [REDACTED]
Planning einde : n.t.b.		- Instructieboekje;	V&G-coördinator uitvoeringsfase
Maximaal aantal gelijktijdig aanwezige werknemers :	Rev 1.0, d.d. nov. 2021	- Presentielijst	

[illegible]

Communicatie => de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven			Hulpdiensten	
Overleg	Doel / bijzonderheden	Frequentie		
Startwerkinstructie	Instructie over VGM-plan en specifieke regels en voorschriften.	Voor aanvang	Hulpdiensten	112 (spoed)
Daily-stand	Bespreek veiligheidsissues afgelopen dag en de dag die komen gaat.	1x per dag	Politie	0900 - 8844 (indien geen spoed)
Toolboxmeeting	Bespreek relevante VGM-onderwerp(en) en aandachtspunten zoals (bijna)ongevallen.	1x per maand	Huisarts	Huisartsenpraktijk De Groote Polder
Werkplek Audit	Middels de WAVE-app houden van specifieke VGM-rondgang door leidinggevende van het werk.	1x per maand	Adres	Westerstraat 41, 4791 HT Klundert
GPI	Middels de website explainsafe.nl.	1x per jaar	Telefoonnr.	0168 40 9000
			Ziekenhuis	Albert Schweitzer Ziekenhuis
			Adres	Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht

juni 2022
