



# Hoogheemraadschap van Rijnland

uw kenmerk: Beens Groep  
uw brief van: 13 september 2016 t.a.v. de heer K. Kranenburg  
ons kenmerk: 16.087984 V63325 Nylonstraat 16  
bijlagen: 2 8281 JX GENEMUIDEN  
inlichtingen: P. Dukker  
doorkiesnummer: (071) 306 34 60  
onderwerp: toepassing secundaire kering Leiden, - 6 OKT. 2016

Geachte heer Kranenburg,

Naar aanleiding van uw verzoek ter plaatse van de Driegatenbrug af te wijken van de in besluit 16.041632 V63325 voorgeschreven werkwijze, bericht ik u het volgende.

## Overwegende

- dat met de voorgestelde werkwijze de bestaande damwand in één keer zal worden gedemonteerd;
- dat tijdens het verwijderen en plaatsen van de nieuwe oeverconstructie een tijdelijke damwandscherm voor de bestaande wordt geplaatst;
- dat ter plaatse sprake is van een brede kering (meer dan twintig meter) en dat in geval van een calamiteit er voldoende restbreedte over zal blijven opdat de kerende functie te allen tijde is gewaarborgd;
- gezien de breedte van de Zijl en de tijdelijkheid er geen negatieve gevolgen zijn voor de afvoer;

is besloten inzake besluit V63325:

- bijlage B (mail d.d. 13 september 2016 met de voorgestelde werkwijze) en bijlage C (locaties waarbij gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke damwandscherm) aan de vergunning toe te voegen.
- voorschrift 5 uit besluit 16.041632 V63325 niet van toepassing te verklaren op de locaties zoals weergegeven in bijlage C.

## Bezwaren

Gedurende zes weken na verzending van dit besluit kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Tevens kunt u bij een spoedeisend belang een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage.

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.




Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker (071-3063460).

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

h.s.  


Mw. L. Schrama,  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,  
Teamleider Zuid-West

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

## Dukker, Paules

**Van:** Kees Kranenburg <k.kranenburg@beensgroep.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 13 september 2016 15:20  
**Aan:** Dukker, Paules  
**CC:** Gerrit Beens  
**Onderwerp:** T5.1\_uitvoering Beens Groep  
**Bijlagen:** Locatie 4 afstanden dubbele gordingen.pdf; Aanzicht bestaande damwanden locatie 4.pdf

**Opvolgingsmarkering:** Opvolgen  
**Markeringsstatus:** Gemarkeerd

Beste heer Dukker,

Zoals je weet zijn wij werkzaamheden aan het uitvoeren aan de Zijldijk te Leiderdorp.  
De werkzaamheden lopen volgens planning en zijn naar verwachting week 5-2017 gereed.

Op een locatie (nabij de driegatenbrug) stuiten wij op een situatie die anders is dan wij op voorhand hadden gedacht.

Namelijk er zit een damwandscherm met een 3 dubbele gording, terwijl wij dachten dat er 1 gording aanwezig zou zijn (zo is het namelijk het gehele traject en op bestekstekeningen aangegeven).

Doordat de gordingen onder water gemonteerd zijn moeten er beheersmaatregelen getroffen worden.

Wij hebben samen met onze opdrachtgever (Provincie Zuid Holland) hierover gesproken en diverse alternatieven besproken omtrent de uitvoering.

De meest voor de hand liggende uitvoeringsmethode is :

- Een tijdelijke damwandscherm voor de bestaande plaatsen
- Om de damwand dicht te krijgen voorzien wij deze deels met aanvulling van zand onder talud
- Het water wordt uit de kuip getrokken
- We kunnen dan in den droge de balken demonteren
- Na demontage plaatsen we direct de nieuwe stalen damwand
- Na aanbrengen nieuwe damwand het zand verwijderen en de tijdelijke damwandplanken

Gezien het waterschap beheerder is van de dijk willen wij u graag hiervoor benaderen.  
Ziet u nog risico's in deze?

Ik kan me voorstellen dat langdurig onttrekken van water in de kuip gevolgen heeft voor de dijk (uitvoering van 1 week).

Als maatregelen zouden we kunnen kiezen om de kuip dagelijks weer af te vullen en leeg te trekken.

Als bijlage de situatie met de daarbij behorende strekkende meters.

Mogelijk kunnen wij elkaar binnenkort eens treffen om e.a. nader door te nemen.

Wanneer u geen opmerkingen heeft dan voeren wij de werkzaamheden uit conform bovengenoemde omschrijving (geplande uitvoering week 39).

Wij zien je reactie graag tegemoet, alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,  
Ing. C. (Kees) Kranenburg  
Projectleider


Behoort bij besluit van  
Dijkgraaf en hoogheemraden  
van Rijnland nr. **V63325**

d.d. - 6 OKT. 2016

Afdelingshoofd  
Plantoetsing en Vergunningverlening



# Bylage C

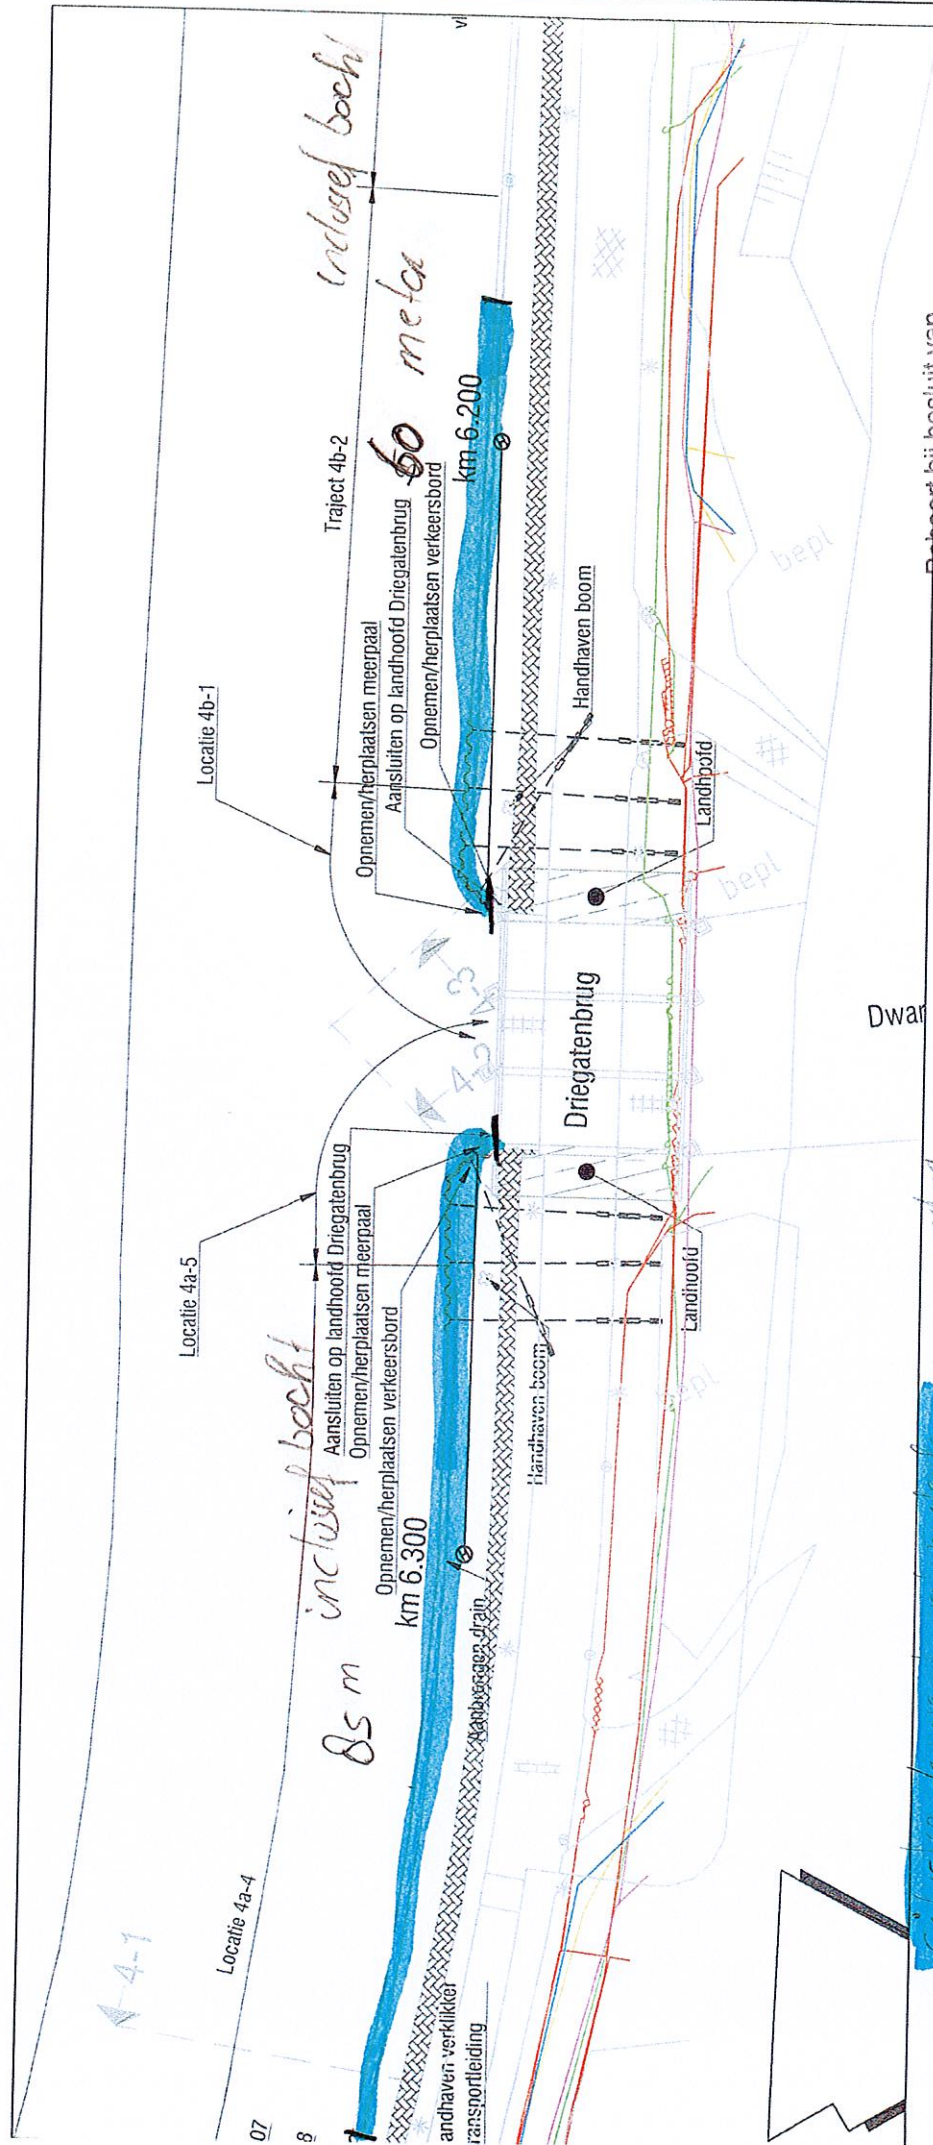

Behoort bij besluit van  
Dijkgraaf en hoogheemraden  
van Rijnland nr. **V3325**

d.d. - 6 OKT. 2015

Afdelingshoofd  
Plantoetsing en Vergoedingverlening

*Handwritten note:* 51.9.12 dan naar de vergoeding

