



## **Projectplan Waterwet**

### **Beschoeiing Westerwijtwerd**

projectnr. 564  
revisie 0  
22 november 2017

**auteur(s)**  
K.H.R. Meijer

**Opdrachtgever**

datum vrijgave	beschrijving revisie 0		
22 nov. 2017			

## Inhoud

blz.

<b>1</b>	<b>Beschoeiing Westerwijtwerd .....</b>	<b>2</b>
1.1	Aanleiding en doel .....	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied .....	2
1.3	Beschrijving van de waterstaatswerken .....	2
1.4	Effecten van het plan .....	3
1.5	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd .....	3
1.6	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen .....	3
1.6.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan.....</i>	<i>3</i>
1.6.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering.....</i>	<i>3</i>
1.6.3	<i>Nadeelcompensatie .....</i>	<i>3</i>
1.7	Legger en beheer en onderhoud .....	4
1.7.1	<i>Legger.....</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beheer en onderhoud.....</i>	<i>4</i>
1.8	Samenwerking .....	4
<b>2</b>	<b>Verantwoording.....</b>	<b>5</b>
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving.....	5
2.2	Verantwoording op basis van beleid .....	5
2.2.1	<i>Toets beleid waterschap .....</i>	<i>5</i>
2.3	Verantwoording van de keuzen in het project .....	5
2.4	Benodigde vergunningen en meldingen .....	5
<b>3</b>	<b>Bevoegdheid en gevolgde procedure .....</b>	<b>6</b>
3.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan .....	6
3.2	Procedure .....	6
<b>4</b>	<b>Rechtsbescherming .....</b>	<b>6</b>
<b>Bijlage 1: Situatietekening beschoeiing Westerwijtwerd.....</b>		<b>1</b>
<b>Bijlage 2: Eigenaren kaart .....</b>		<b>1</b>

# 1 Beschoeiing Westerwijterwerd

## 1.1 Aanleiding en doel

In verband met werkzaamheden aan de brug Westerwijterwerdraai in Westerwijterwerd wordt de beschoeiing vervangen bij de aansluiting van de keerwanden van de nieuwe draaibrug.

## 1.2 Ligging en begrenzing plangebied

In dit project wordt langs de Westerwijterwerdermaar in Westerwijterwerd aansluitend op de nieuw geplaatste brug 'Westerwijterwerdraai' de beschoeiing vervangen. Het waterschap is eigenaar van de watergang Westerwijterwerdermaar, de kadastrale percelen en eigenaren waarlangs de beschoeiing wordt geplaatst zijn: MDS02G495 eigenaar K. Wijkstra; MDS02G496 eigenaar A.M. Broekhuis, MDS02G497 eigenaar A.J.M. Scheepstra; MDS02G188 eigenaar A.H. Mooijman; MDS02G837 eigenaar gemeente Loppersum. RD coördinaten x 238.850, y 594.810.



## 1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken

De te vervangen beschoeiing is gesitueerd langs de oever van de Westerwijterwerdermaar en sluit aan op de keerwanden van de nieuwe brug. De beschoeiing bestaat uit kunststof palen en schotten. Het betreft de locatie aan de oost- en westzijde van de tocht aan weerszijden van de brug. Aan de oostzijde betreft het het perceel van de gemeente Loppersum en eigenaar Mooiman. Aan de westzijde betreft het het perceel van de gemeente Loppersum, Wijkstra, Broekhuizen en Scheepstra. Met betrekking tot de beschikbaarheid van de benodigde gronden is met de eigenaren overeenstemming en afstemming voor gebruik daarvan.



## **1.4 Effecten van het plan**

Door vervanging van de beschoeiing blijft de grondkerende functie gewaarborgd. De beschoeiing heeft geen gevolgen voor aan en afvoer van het beschikbare volume oppervlaktewater. Tijdens de werkzaamheden wordt de tocht gestremd voor de scheepvaart.

De onderhoudsplicht (en daarmee de vervanging) van een beschoeiing ligt, volgens de huidige regelgeving, veelal bij de eigenaar van het aangrenzend perceel. In eerste instantie functioneert beschoeiing, wanneer dat al aanwezig is, als een grondkerende constructie, zodat de grond van een particulier perceel niet weg kan spoelen.

In veel gevallen is er pas een onderhoudsplicht voor het waterschap weggelegd, wanneer de waterhuishouding van de watergang of de uitvoering van waterhuishoudkundige taken van het waterschap in het geding dreigen te komen.

De beschoeiing langs de percelen van Wijkstra, Broekhuizen en Scheepstra wordt eenmalig op kosten van het waterschap aangebracht ter compensatie van het overlast van toegang percelen gedurende de vervanging van de draaibrug in Westerwijtwerd.

## **1.5 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd**

De werkzaamheden zullen vanaf het water gebeuren door middel van pontons en vergen circa 1 a 2 weken. Achter de beschoeiing wordt de berm met grond aangevuld.

## **1.6 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen**

### ***1.6.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan***

De werkzaamheden worden buiten het vaarseizoen uitgevoerd. Tijdens de uitvoering zal de tocht door middel van bebording voor de scheepvaart gestremd worden.

### ***1.6.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering***

Er wordt gebruik gemaakt van materialen die zijn gecertificeerd. Voor wat betreft de Flora en Fauna wordt de geldende gedragscode in acht te genomen.

### ***1.6.3 Nadeelcompensatie***

N.v.t.



## **1.7 Legger en beheer en onderhoud**

### **1.7.1 Legger**

De geplaatste beschoeiing wordt opgenomen in de legger of beheersregister aangezien het geen tijdelijke voorziening betreft.

### **1.7.2 Beheer en onderhoud**

Het beheer en onderhoud van de waterstaatwerken wijkt niet af van de huidige situatie hetgeen inhoudt dat het beheer en onderhoud blijft bij de aanliggende eigenaren.

## **1.8 Samenwerking**

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk door één aannemer in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd. De betrokken eigenaren zijn op de hoogte van de werkzaamheden die worden uitgevoerd.



## 2 Verantwoording

### 2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

In de oever van de Westerwijtwerdermaar nabij de vervangen brug wordt beschoeiing geplaatst. Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en voor toepassing in de waterbouw geschikt zijn.

### 2.2 Verantwoording op basis van beleid

#### 2.2.1 *Toets beleid waterschap*

De werkzaamheden worden conform het "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005, uitgevoerd.

### 2.3 Verantwoording van de keuzen in het project

De aanleiding voor het vervangen van de beschoeiing is het voorkomen van verzakking van de oever en voor de percelen van Wijkstra, Broekhuizen en Scheepstra betreft het een compensatie van het overlast van toegang percelen gedurende de vervanging van de draaibrug in Westerwijtwerd. Er wordt daarbij aangesloten aan bij de bestaande oeverbeschoeiing. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het vaarseizoen. De Westerwijtwerdermaar wordt voor de scheepvaart tijdelijk gestremd.

### 2.4 Benodigde vergunningen en meldingen

Voor deze werkzaamheden is geen vergunning dan wel een melding benodigd. Met betrekking tot de Flora en Faunawet wordt de gedragsregel toegepast.



## 3 Bevoegdheid en gevolgde procedure

### 3.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2011, gedateerd 23 november 2011, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

### 3.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

## 4 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

Een bezwaarschrift wordt door het bestuur uitsluitend in behandeling genomen indien het per gewone of aangetekende brief is ingediend. Voor het instellen van bezwaar heeft het waterschapsbestuur de elektronische weg (e-mail) niet opengesteld.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepsschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.



Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.






**Bijlage 1: Situatietekening beschoeiing Westerwijtwerd**

**Bijlage 2: Eigenaren kaart**

## Bijlage 1: Situatietekening beschoeiing Westerwijtwerd

### Situatietekening

beschoeiing Westerwijtwerd

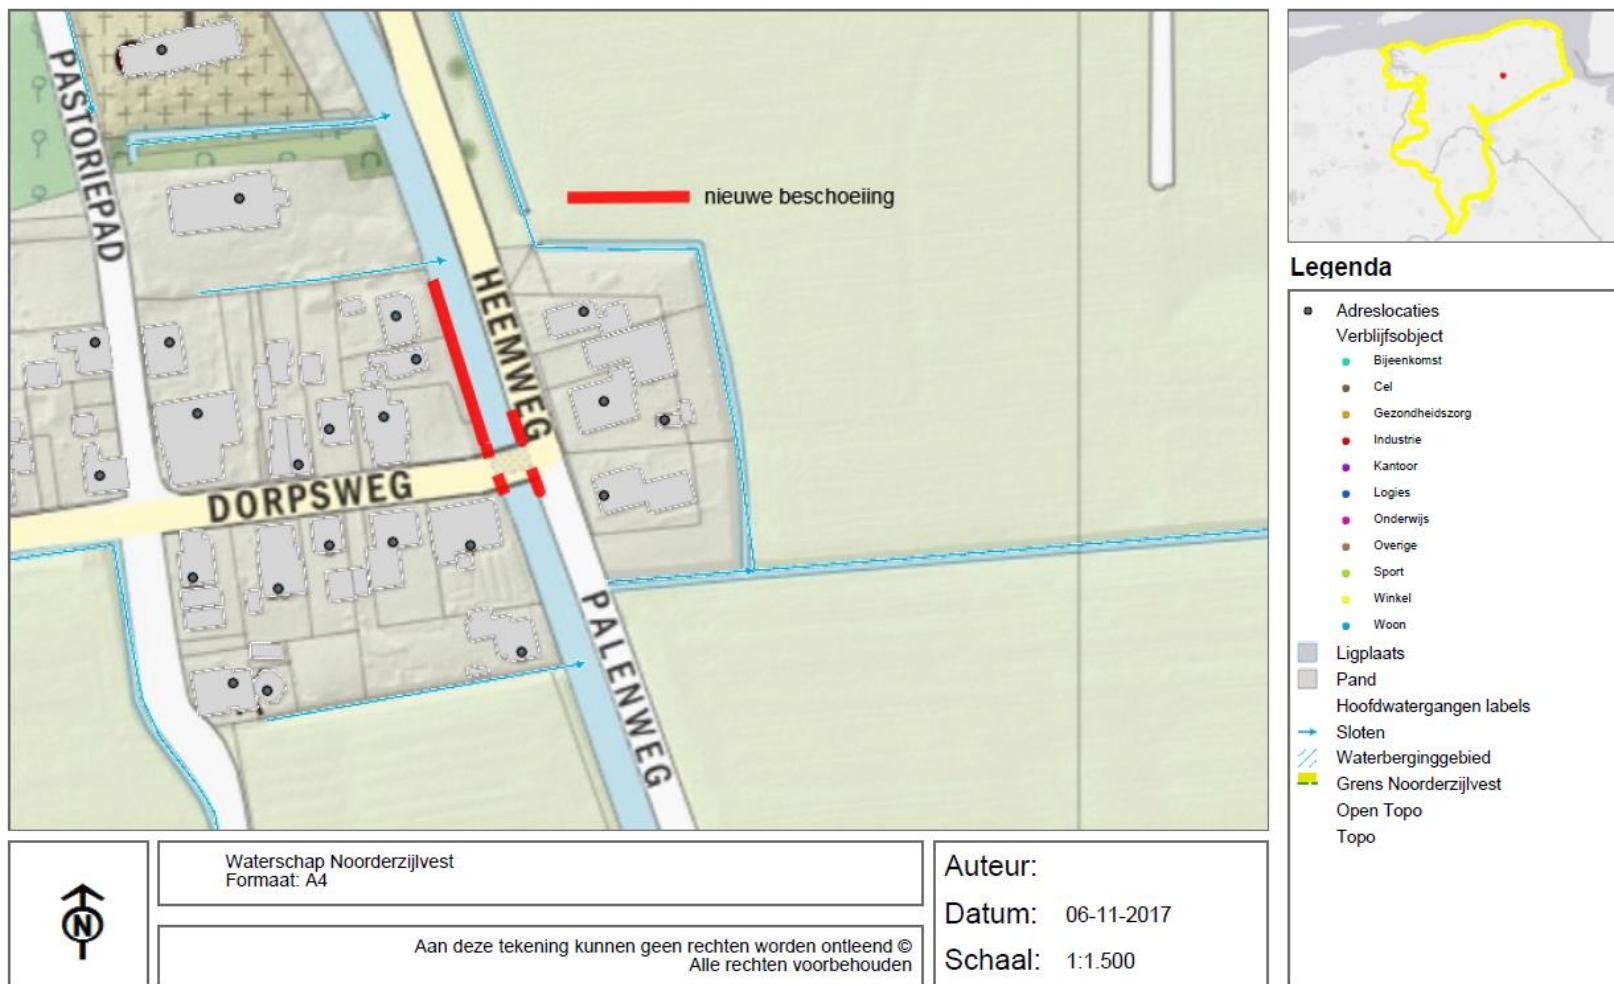



## Bijlage 2: Eigenarenkaart

### overzicht eigenaren

geel gearceerd

