

M&W Bouw

Zevenhoven

t.a.v. D.h.r. Bouwmeester

d.d. 01 -10-2020

Betreft : Jongezevenhovenseweg 1 / ontgraven/aanlegdiepte fundering / betonplaat gesloopte schuur.

Beste Meneer Bouwmeester ,

We hebben de oude melkschuur gesloopt maar we hebben bewust de betonplaat van die schuur laten liggen zodat wij hier gebruik van kunnen maken tijdens de bouw van de nieuwe woning , na dat de woning gereed is zullen wij deze betonplaat verwijderen en afvoeren .



Werkwijze ontgraven en opbouw van de fundering :

- ontgraven tot – 5130 n.a.p.
- zandpakket aanbrengen dikte 100 mm tot – 5030 n.a.p.
- aanbrengen o.s.b. werkvloer dikte 10 mm tot – 5020 n.a.p.
- wapening bekisting aanbrengen hoogte 500 mm tot – 4520 n.a.p.
- aanbrengen vloer incl smeervloer dikte 290 mm tot – 4230 n.a.p.

Met vriendelijke groet,

Michael Muijs



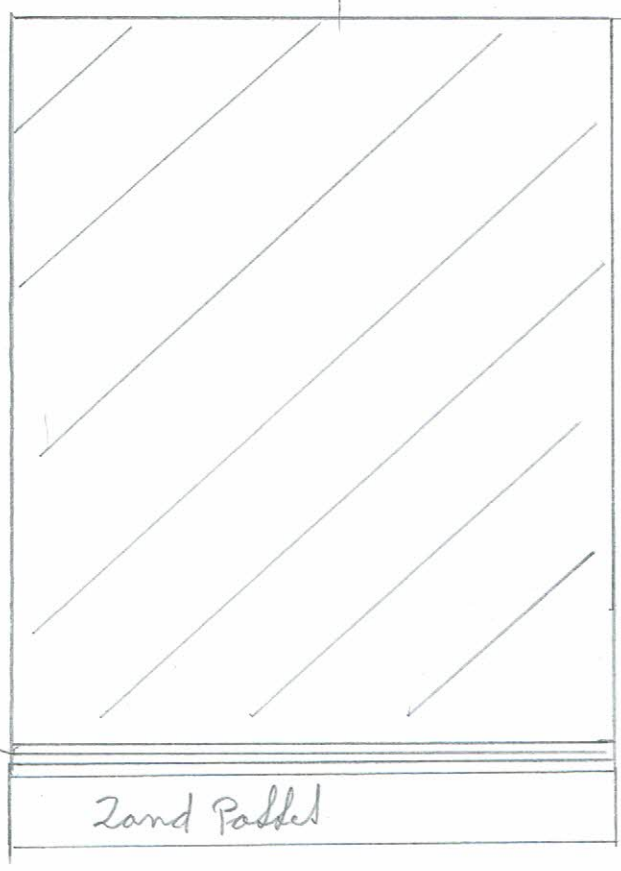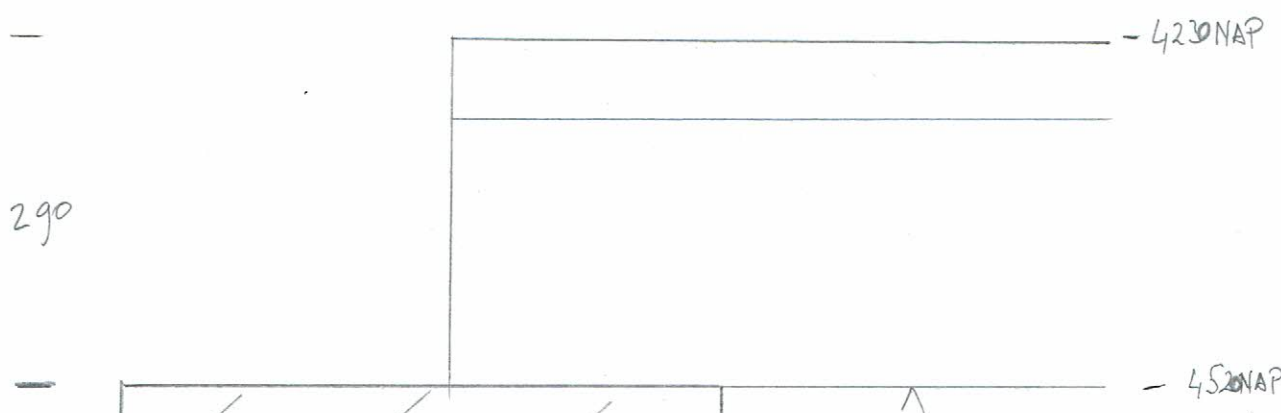

500

O.S.B. wharf



- | | | |
|-----|-------------|---------------|
| 10 | <u>✓</u> | - 5020 N.A.P. |
| | <u> </u> | - 5030 N.A.P. |
| 100 | <u> </u> | - 5130 N.A.P. |
