Werkterrein & opstelplaatsen - Tie-inlocatie

KLIC gegevens - Tie-inlocatie

Legenda

- 36” leiding RPP
- Rijroute
- Feature
- Las
- Bemaling - filters
- Afvoerleiding
- Lozingspunt bemaling
- Strofilter
- Werkput
- Rijplaten (Ferex)
- Rijplaten (staal)
- Opstelloc keet en container(s)
- Gronddepot
- Bouwhekken
- Damwandkuip
- Beveiligingscamera

Werkomschrijving

Voorbereiding

- Mobiliseren materiaal en materieel.
- Meten verdichting vooraf t.h.v. werkputlocatie en omliggende maaiveld (middels handsondeerapparaat met registratiekaart).

Materiaal en materieel:

- Directieunit, opslag container, gereedschapscontainer, pakcontainer, aggregaat, schaftruimte, toilet en handenwasunit (staan nabij de Klaverpolderseweg).
- Rupsgraafmachine (8 tons).
- Skigaas t.b.v. afzetten werkput.
- Verkeersmaatregelen: Geen.

Graafwerkzaamheden

- Afzetten teelaarde.
- Ontgraven werkput onder talud. Grondlagen gescheiden opslaan. Maximale ontgravingsdiepte ca. 2,40m-mv.
- Uitvoeren inspectie en, indien nodig, kwelscherm repareren.
- Werkput laagsgewijs aanvullen met uitgekomen grond in oorspronkelijke profiel en verdichten.
- Indien geotextiel wordt aangetroffen en opgenomen, dan deze herstellen met minimaal 50cm overlap aan weerszijden.

Afwerken en herstel

- Afvoeren materialen.
- Afwerken locatie en herstellen (geotextiel) volgens gemaakte afspraken tussen RRP en Waterschap Brabantse Delta.
- Meten verdichting achteraf t.h.v. werkputlocatie en omliggende maaiveld (middels handsondeerapparaat met registratiekaart).
- Demobiliseren.

Projectinformatie

Informatie

- Adres: Nabij Zwaluwsedijk 11, 4781 PB Moerdijk
- Diameter: 36”
- Paalnummer: 9-0700
- Dekking leiding: ca. 1,40m-mv
- GWS: Onder ontgravingsniveau

Uitgangspunten

- KLIC melding wordt gedaan voorafgaand aan de werkzaamheden.
- Bodemprofiel dijk: zand, matig grof, zwak ziltig
- Werkterrein is bereikbaar via onderhoudspad met aangegeven rijroute.
- Graafwerkzaamheden kunnen onder veilig talud worden uitgevoerd.

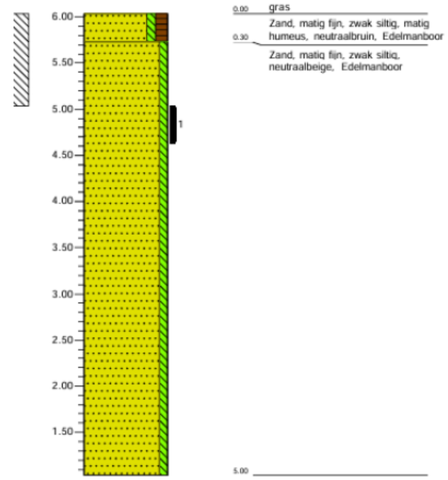

Foto’s

Revisie	Datum	Omschrijving	Uitgev.
B	17-4-25	Tekstuele aanpassingen en locatie werkput verplaatst. Boorstaat toegevoegd.	STj

- Opdrachtgever: Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij
- Project: Projecten West—Werkzaamheden L9
- Onderdeel: Vrij leggen L9
- Tekeningnummer: 15025010-PvA-28
- Schaal: n.v.t.
- Formaat: A3
- Sheet: 1 van 1
- Status: Definitief
- Datum revisie A (origineel): 14-04-2025
- Getekend door: STj
- Feature ID: ...
- Gecontroleerd: EvG/JZ
- Lasnummer: 9-0700

Het copyright van deze tekening behoort toe aan:

Koninklijke oosterhofholman MILIEUTECHNIEK BV
Infra
Milieutechniek
Beton– en waterbouw
Groen
GRIJPSKERK
Kievitsweg 13
Postbus 6
9843 ZG Grijpskerk
t. (0594) 28 01 23
f. (0594) 21 28 83
info@oosterhofholman.nl
www.oosterhofholman.nl
